

Untitled Gantt Project

14-ene-2016

<http://>

Encargado del proyecto

Urtzi Larrazabal Santos

Fechas de inicio y fin del proyecto

23-sep-2015 - 14-ene-2016

Progreso

73%

Tarea

44

Recursos

7

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Duración
PAC1	23/09/15	14/10/15	16
Lectura de literatura sobre tesis recientes	23/09/15	25/09/15	3
Lluvia de ideas. Seleccionar dos temas candidatos	28/09/15	1/10/15	4
Evaluar las dos ideas seleccionadas y elegir una	2/10/15	5/10/15	2
Descripción del Trabajo Final de Grado (TFG).	6/10/15	9/10/15	4
Objetivos del Trabajo	8/10/15	9/10/15	2
Enfoque y método a seguir	12/10/15	13/10/15	2
Planificación del Trabajo	12/10/15	14/10/15	3
Documentación de la PAC 1	6/10/15	14/10/15	7
Entrega de la PAC 1	14/10/15	14/10/15	1
PAC2	12/10/15	18/11/15	28
Estudio de la LOPD y legislación vigente	15/10/15	16/10/15	2
Seleccionar Hospitales y conseguir contactos de IT	19/10/15	22/10/15	4
Contactar IT de Hospitales y recoger información	22/10/15	27/10/15	4
Seleccionar y contactar proveedores de electromedicina y laboratorios	28/10/15	2/11/15	4
Recoger y documentar problemas y necesidades comunes	3/11/15	4/11/15	2
Definir arquitectura del sistema a desarrollar	5/11/15	9/11/15	3
Estudiar opciones de funcionalidad y formato	9/11/15	12/11/15	4
Revisión estado tareas	12/10/15	12/10/15	0
Selecciona tecnología y formato para el desarrollo	12/11/15	12/11/15	1
Documentación de la PAC2	3/11/15	18/11/15	12
Entrega de la PAC 2	18/11/15	18/11/15	1
PAC3	19/11/15	16/12/15	20
Diseño lógico del sistema	19/11/15	24/11/15	4
Crear Prototipo (New task)	25/11/15	26/11/15	2
Entregar beta a responsables IT de Hospitales	27/11/15	30/11/15	2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Duración
Recibir feedback y estudiar cambios	1/12/15	2/12/15	2
Realizar cambios propuestos	3/12/15	8/12/15	4
Revisión de estado prototipo	3/12/15	3/12/15	0
Desarrollo del sistema (funcionalidad prototipo) - Fase 1	9/12/15	16/12/15	6
Replanificación del proyecto por retraso en desarrollo	10/12/15	10/12/15	1
Documentar PAC3	19/11/15	16/12/15	20
Entregar PAC3	16/12/15	16/12/15	1
PAC4	17/12/15	13/01/16	20
Desarrollo (funcionalidad prototipo) fase 2	17/12/15	24/12/15	6
Revisar estado desarrollo	22/12/15	22/12/15	0
Documentación de enfoque y método seguido	25/12/15	29/12/15	3
Resumen de información y feedback obtenido	30/12/15	1/01/16	3
Breve descripción de capítulos de la Memoria	31/12/15	1/01/16	2
Documentación de la Memoria	28/12/15	4/01/16	6
Preparación de la Defensa	5/01/16	7/01/16	3
Grabación de la Defensa	8/01/16	8/01/16	1
Autoinforme del Trabajo	11/01/16	12/01/16	2
Entrega de la Memoria y la Defensa	13/01/16	13/01/16	1

Recursos

Nombre	Función
Urtzi Larrazabal Santos	Encargado del proyecto
O.M.P, Roche Diagnostics	Beta tester
C.F.G, Siemens.	Beta tester
U.F, Agfa	Beta tester
B.C.A. Hospital Universitario de Cruces	Beta tester
A.L.I. Hospital Universitario de Araba	Beta tester
V.F Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín	Beta tester

Diagrama de Gantt

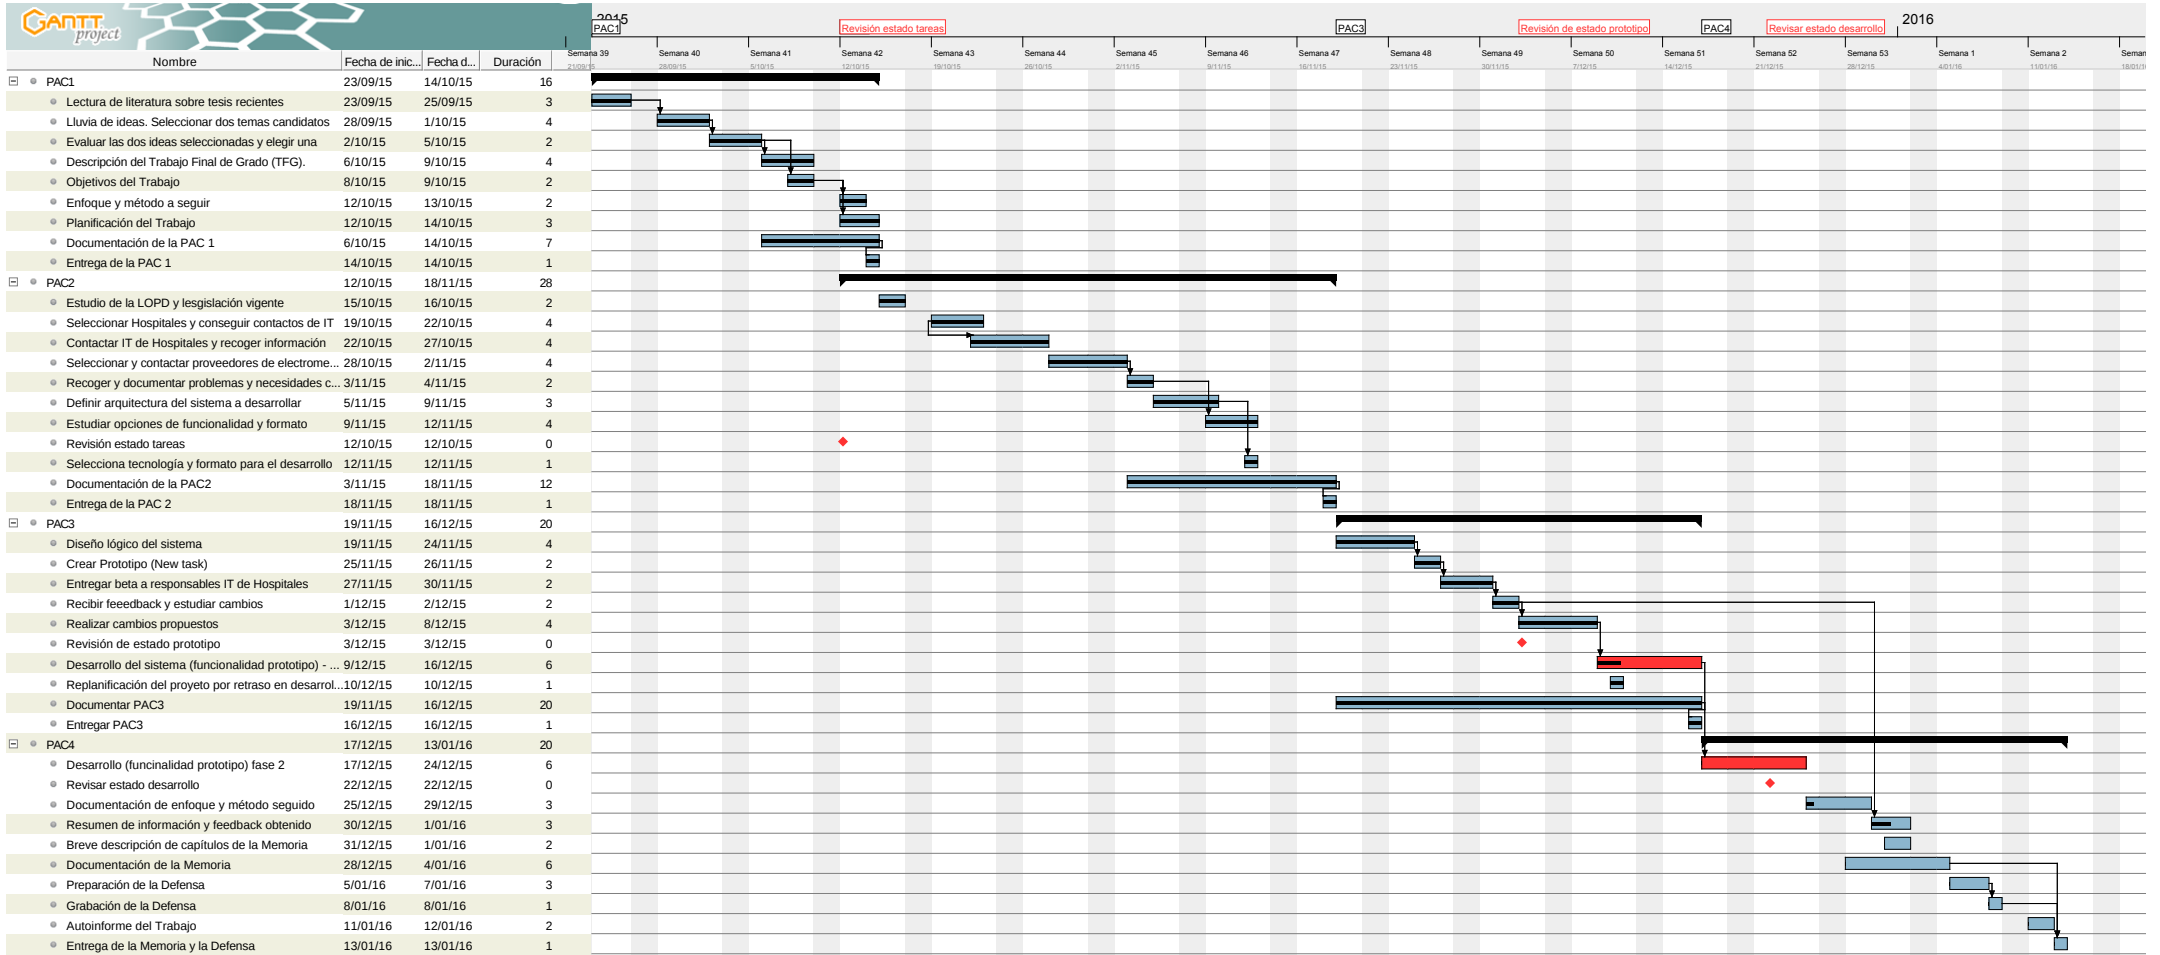


Diagrama de recursos

