


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Calendar																																									
					sep '16	M	X	J	V	S	D	26 sep '16	L	M	X	J	V	S	D	03 oct '16	L	M	X	J	V	S	D	10 oct '16	L	M	X	J	V	S	D	17 oct '16	L	M	X	J	V	S	D	24 oct '16	L	M
1	1. Redacció de la memòria	84 días	mié 21/09/16	lun 16/01/17	[Barra de actividad]																																									
2	2. Definició del projecte	12 días	mié 21/09/16	jue 06/10/16	[Barra de actividad]																																									
3	3. PAC 1 - Lliurament	0 días	jue 06/10/16	jue 06/10/16	[Barra de actividad]																																									
4	4. Creació de la marca	19 días	vie 07/10/16	jue 03/11/16	[Barra de actividad]																																									
5	4.1. Creació del Nom i Logotip	7 días	vie 07/10/16	dom 16/10/16	[Barra de actividad]																																									
6	Feedback consultor	0 días	lun 17/10/16	lun 17/10/16	[Barra de actividad]																																									
7	4.2. Imatge Corporativa	13 días	lun 17/10/16	mié 02/11/16	[Barra de actividad]																																									
8	Feedback consultor	0 días	jue 03/11/16	jue 03/11/16	[Barra de actividad]																																									
9	5. PAC 2 - Lliurament	0 días	mié 02/11/16	mié 02/11/16	[Barra de actividad]																																									
10	6. Look&Feel	17 días	jue 03/11/16	lun 28/11/16	[Barra de actividad]																																									
11	6.1. Wireframes de l'aplicació i web	7 días	jue 03/11/16	vie 11/11/16	[Barra de actividad]																																									
12	Feedback consultor	0 días	lun 14/11/16	lun 14/11/16	[Barra de actividad]																																									
13	6.2. High Def. Prototypes de l'App	6 días	lun 14/11/16	dom 20/11/16	[Barra de actividad]																																									
14	Feedback consultor	0 días	lun 21/11/16	lun 21/11/16	[Barra de actividad]																																									
15	6.3. High Def. Prototypes del web	6 días	lun 21/11/16	dom 27/11/16	[Barra de actividad]																																									
16	Feedback consultor	0 días	lun 28/11/16	lun 28/11/16	[Barra de actividad]																																									
17	7. Direcció d'art	30 días	lun 28/11/16	lun 09/01/17	[Barra de actividad]																																									
18	7.1. Disseny d'elements	11 días	lun 28/11/16	dom 11/12/16	[Barra de actividad]																																									
19	Feedback consultor	0 días	lun 12/12/16	lun 12/12/16	[Barra de actividad]																																									
20	7.2. Desenvolupament de la	10 días	lun 12/12/16	vie 23/12/16	[Barra de actividad]																																									
21	Feedback consultor	0 días	lun 26/12/16	lun 26/12/16	[Barra de actividad]																																									
22	7.3. Espot publicitari	11 días	lun 26/12/16	dom 08/01/17	[Barra de actividad]																																									
23	Feedback consultor	0 días	lun 09/01/17	lun 09/01/17	[Barra de actividad]																																									
24	8. PAC3 - Lliurament	0 días	dom 04/12/16	dom 04/12/16	[Barra de actividad]																																									
25	9. Lliurament TFG	0 días	lun 16/01/17	lun 16/01/17	[Barra de actividad]																																									

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	31 oct '16							07 nov '16							14 nov '16							21 nov '16							28 nov '16							05 dic '16						
					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
1	1. Redacció de la memòria	84 días	mié 21/09/16	lun 16/01/17	[Barra de actividad continua]																																									
2	2. Definició del projecte	12 días	mié 21/09/16	jue 06/10/16	[Barra de actividad continua]																																									
3	3. PAC 1 - Lliurament	0 días	jue 06/10/16	jue 06/10/16	[Barra de actividad continua]																																									
4	4. Creació de la marca	19 días	vie 07/10/16	jue 03/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
5	4.1. Creació del Nom i Logotip	7 días	vie 07/10/16	dom 16/10/16	[Barra de actividad continua]																																									
6	Feedback consultor	0 días	lun 17/10/16	lun 17/10/16	[Barra de actividad continua]																																									
7	4.2. Imatge Corporativa	13 días	lun 17/10/16	mié 02/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
8	Feedback consultor	0 días	jue 03/11/16	jue 03/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
9	5. PAC 2 - Lliurament	0 días	mié 02/11/16	mié 02/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
10	6. Look&Feel	17 días	jue 03/11/16	lun 28/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
11	6.1. Wireframes de l'aplicació i web	7 días	jue 03/11/16	vie 11/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
12	Feedback consultor	0 días	lun 14/11/16	lun 14/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
13	6.2. High Def. Prototypes de l'App	6 días	lun 14/11/16	dom 20/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
14	Feedback consultor	0 días	lun 21/11/16	lun 21/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
15	6.3. High Def. Prototypes del web	6 días	lun 21/11/16	dom 27/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
16	Feedback consultor	0 días	lun 28/11/16	lun 28/11/16	[Barra de actividad continua]																																									
17	7. Direcció d'art	30 días	lun 28/11/16	lun 09/01/17	[Barra de actividad continua]																																									
18	7.1. Disseny d'elements	11 días	lun 28/11/16	dom 11/12/16	[Barra de actividad continua]																																									
19	Feedback consultor	0 días	lun 12/12/16	lun 12/12/16	[Barra de actividad continua]																																									
20	7.2. Desenvolupament de la	10 días	lun 12/12/16	vie 23/12/16	[Barra de actividad continua]																																									
21	Feedback consultor	0 días	lun 26/12/16	lun 26/12/16	[Barra de actividad continua]																																									
22	7.3. Esport publicitari	11 días	lun 26/12/16	dom 08/01/17	[Barra de actividad continua]																																									
23	Feedback consultor	0 días	lun 09/01/17	lun 09/01/17	[Barra de actividad continua]																																									
24	8. PAC3 - Lliurament	0 días	dom 04/12/16	dom 04/12/16	[Barra de actividad continua]																																									
25	9. Lliurament TFG	0 días	lun 16/01/17	lun 16/01/17	[Barra de actividad continua]																																									

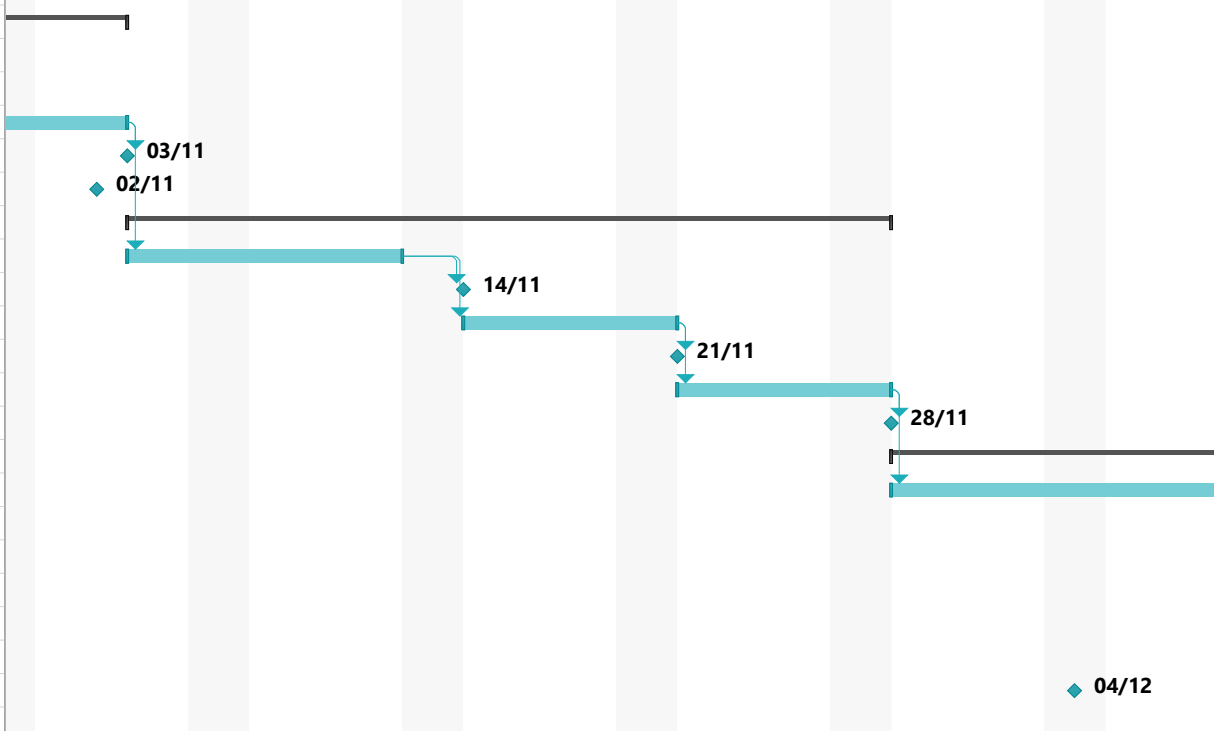

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	12 dic '16 19 dic '16 26 dic '16 02 ene '17 09 ene '17 16 ene																														
					V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
1	1. Redacció de la memòria	84 días	mié 21/09/16	lun 16/01/17	[Barra de progreso completa]																														
2	2. Definició del projecte	12 días	mié 21/09/16	jue 06/10/16	[Barra de progreso completa]																														
3	3. PAC 1 - Lliurament	0 días	jue 06/10/16	jue 06/10/16	[Barra de progreso completa]																														
4	4. Creació de la marca	19 días	vie 07/10/16	jue 03/11/16	[Barra de progreso completa]																														
5	4.1. Creació del Nom i Logotip	7 días	vie 07/10/16	dom 16/10/16	[Barra de progreso completa]																														
6	Feedback consultor	0 días	lun 17/10/16	lun 17/10/16	[Barra de progreso completa]																														
7	4.2. Imatge Corporativa	13 días	lun 17/10/16	mié 02/11/16	[Barra de progreso completa]																														
8	Feedback consultor	0 días	jue 03/11/16	jue 03/11/16	[Barra de progreso completa]																														
9	5. PAC 2 - Lliurament	0 días	mié 02/11/16	mié 02/11/16	[Barra de progreso completa]																														
10	6. Look&Feel	17 días	jue 03/11/16	lun 28/11/16	[Barra de progreso completa]																														
11	6.1. Wireframes de l'aplicació i web	7 días	jue 03/11/16	vie 11/11/16	[Barra de progreso completa]																														
12	Feedback consultor	0 días	lun 14/11/16	lun 14/11/16	[Barra de progreso completa]																														
13	6.2. High Def. Prototypes de l'App	6 días	lun 14/11/16	dom 20/11/16	[Barra de progreso completa]																														
14	Feedback consultor	0 días	lun 21/11/16	lun 21/11/16	[Barra de progreso completa]																														
15	6.3. High Def. Prototypes del web	6 días	lun 21/11/16	dom 27/11/16	[Barra de progreso completa]																														
16	Feedback consultor	0 días	lun 28/11/16	lun 28/11/16	[Barra de progreso completa]																														
17	7. Direcció d'art	30 días	lun 28/11/16	lun 09/01/17	[Barra de progreso completa]																														
18	7.1. Disseny d'elements	11 días	lun 28/11/16	dom 11/12/16	[Barra de progreso completa]																														
19	Feedback consultor	0 días	lun 12/12/16	lun 12/12/16	[Barra de progreso completa]																														
20	7.2. Desenvolupament de la	10 días	lun 12/12/16	vie 23/12/16	[Barra de progreso completa]																														
21	Feedback consultor	0 días	lun 26/12/16	lun 26/12/16	[Barra de progreso completa]																														
22	7.3. Espot publicitari	11 días	lun 26/12/16	dom 08/01/17	[Barra de progreso completa]																														
23	Feedback consultor	0 días	lun 09/01/17	lun 09/01/17	[Barra de progreso completa]																														
24	8. PAC3 - Lliurament	0 días	dom 04/12/16	dom 04/12/16	[Barra de progreso completa]																														
25	9. Lliurament TFG	0 días	lun 16/01/17	lun 16/01/17	[Barra de progreso completa]																														
